
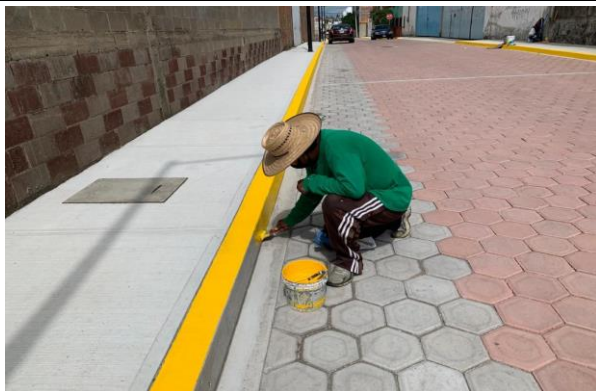


H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

	LATITUD	INICIO 19° 4'43.60"N FINAL 19° 4'43.54"N	LONGITUD	INCIO 98°16'39.60"O FINAL 98°16'46.89"O
	CONTRATO N°.	SISPG/DOP-002/FISM/2022	N°. DE OBRA:	22002
	META	1,365.66 M2 DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	MONTO CONTRATADO	\$ 2,182,604.99
	INICIO DE OBRA	27 DE MAYO DE 2022	TERMINO DE OBRA	24 DE AGOSTO 2022
	NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RÍO YAQUI SUR Y CALLE RÍO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.		


CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	2.49%	ANTICIPO	N/A	N/A		0%
TERRACERIAS	24.77%	ESTIMACION 1	22/07/2022	INGRESADA	\$ 703,190.92	32%
PAVIMENTO CON ADOQUIN	35.29%	ESTIMACION 2 FINIQUITO				0%
SEÑALÉTICA	5.18%					0%
ALUMBRADO PÚBLICO	12.35%					0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	18.83%					0%
TOTALES	98.92%				\$703,190.92	32%



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES

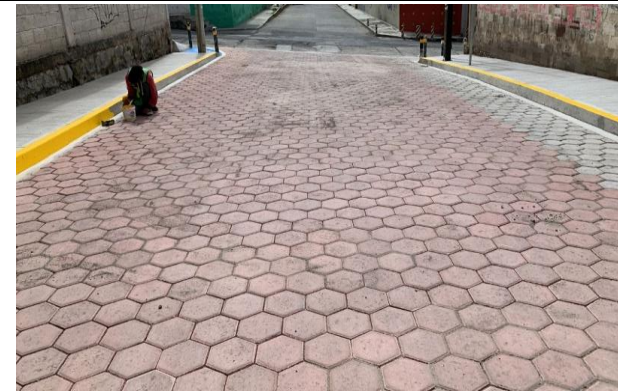

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES
