


H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

	LATITUD		INICIO N/A FINAL N/A	LONGITUD	FECHA DE CORTE 31 DE JULIO 2022	
	CONTRATO N°.		SISPG/DOP-003/FORTA/2022	N°. DE OBRA:	22003	
	META		134 M2 DE REJILLA TIPO IRVING NUEVA	MONTO CONTRATADO		\$ 2,362,821.19
	INICIO DE OBRA		22 DE JUNIO DE 2022	TERMINO DE OBRA		31 DE AGOSTO 2022
	NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA			

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	6.70%	ANTICIPO	N/A	N/A		0%
CIMENTACIÓN	5.17%	ESTIMACION 1			\$ -	0%
ALBAÑILERIA	4.07%	ESTIMACION 2 FINIQUITO				0%
HERRERIA	25.46%					0%
ACABADOS	1.02%					
LIMPIEZA	0.13%					
TOTALES	42.56%				\$0.00	0%

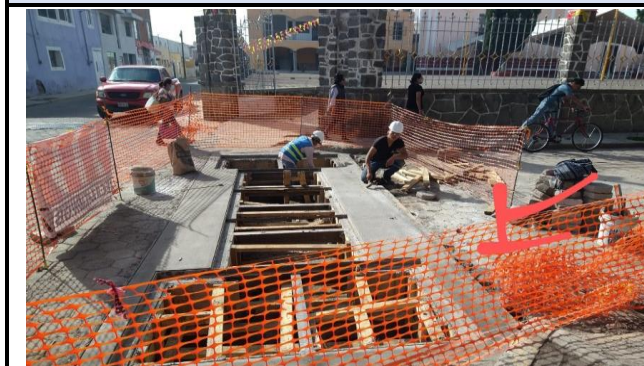

COLADO DE DALAS PERIMETRALES ARMADAS



COLOCACIÓN DE PERFIL IPS DE 6"



COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING.
