

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

	LATITUD		INICIO 19° 2'6.33"N FINAL 19° 1'59.46"N	LONGITUD		INICIO 98°23'22.39"O FINAL 98°23'27.05"O
	CONTRATO N°.		SISPG/DOP-010/FISM/2022	N°. DE OBRA:		22010
	META		1,696.55 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	MONTO CONTRATADO		\$ 1,820,221.06
	INICIO DE OBRA		11 DE JULIO DE 2022			
	TERMINO DE OBRA		08 DE SEPTIEMBRE 2022			
NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO 0+260.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA..				


CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	1.55%	ANTICIPO			\$ 546,066.32	30%
TERRACERIAS	8.42%	ESTIMACION 1			\$ -	0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	3.28%	ESTIMACION 2				0%
PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.00%					0%
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00%					0%
SEÑALÉTICA	0.00%					0%
TOTALES	13.26%				\$ 546,066.32	30%



CIMBRADO DE GUARNICIÓN CON CIMBRA METALICA



EXCAVACIÓN EN CAJA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN

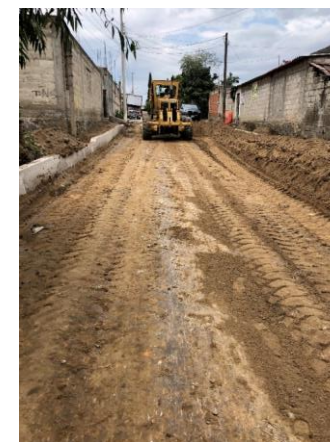

AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO
